

俵坂トンネル(東)進捗状況 2012年6月7日現在


— 掘削完了区間

主要工事内容

工種	単位	設計数量	累計進捗数量	進捗(%)
横坑				
トンネル掘削	m	356.0	356.0	100.0%
本坑				
トンネル掘削	m	2470.0	1853.3	75.0%
インバートコンクリート	m	2470.0	1480.5	59.9%
覆工コンクリート	m	2470.0	1060.5	42.9%



施工ヤード

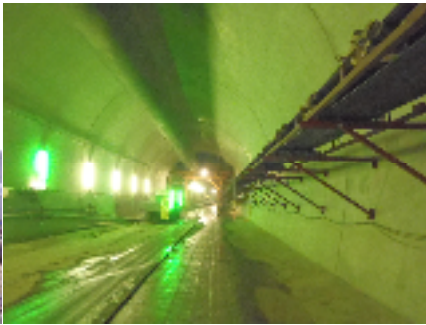

諫早方を望む



切羽の状況



始点側坑口(武雄方)

