



俵坂トンネル(西)進捗状況 2010年5月31日現在

■ 施工完了区間

工種	単位	設計数量	累計進捗数量	進捗(%)
斜路				
トンネル掘削	m	320	320	100
本坑				
トンネル掘削	m	3,030	194.8	6.4
インポートコンクリート	m	3,030	0	0
覆工コンクリート	m	3,030	0	0

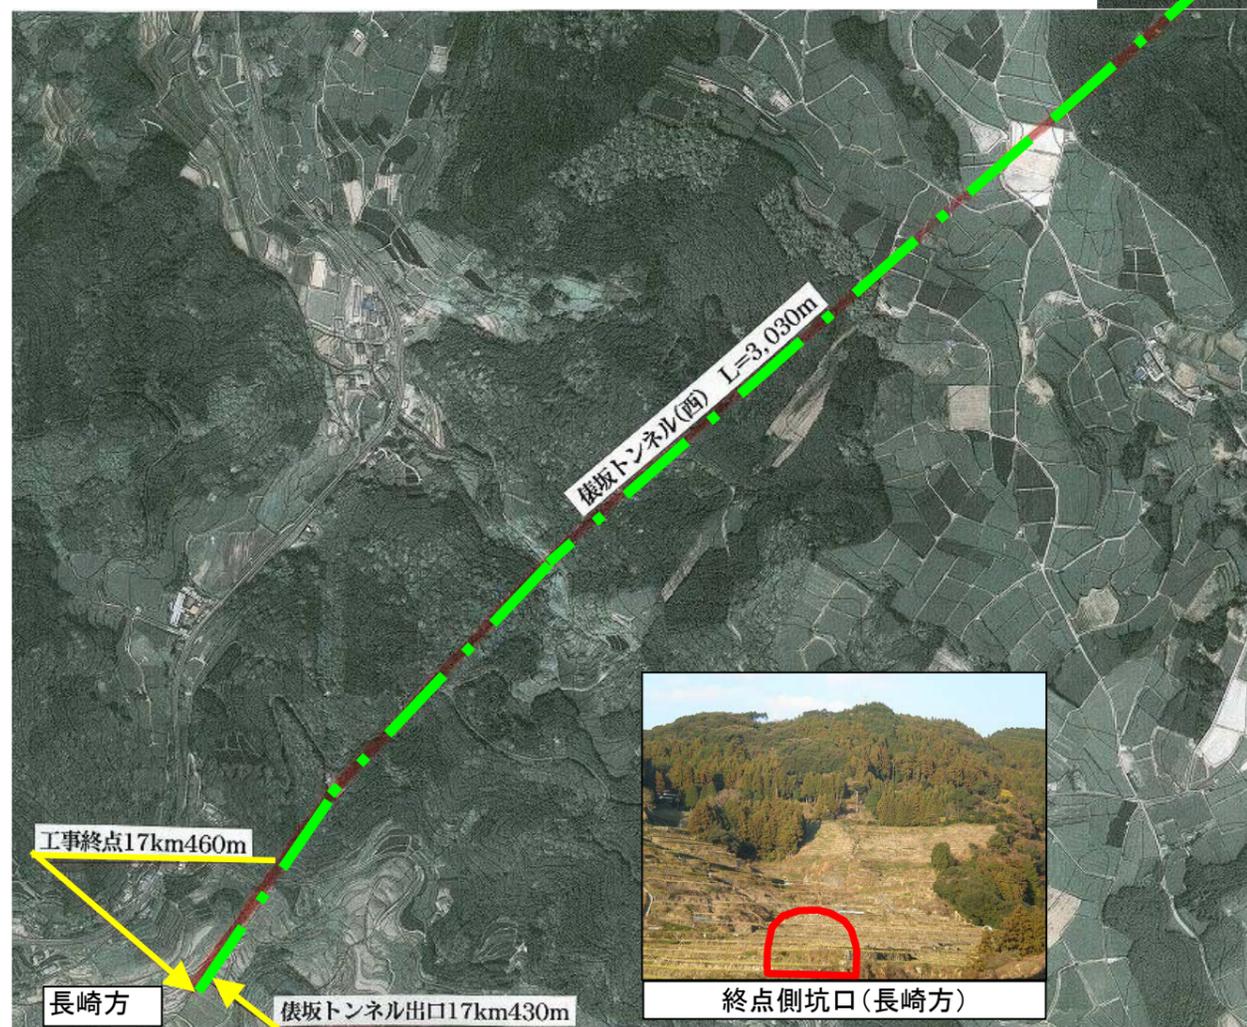

ずり出し状況(長崎方)

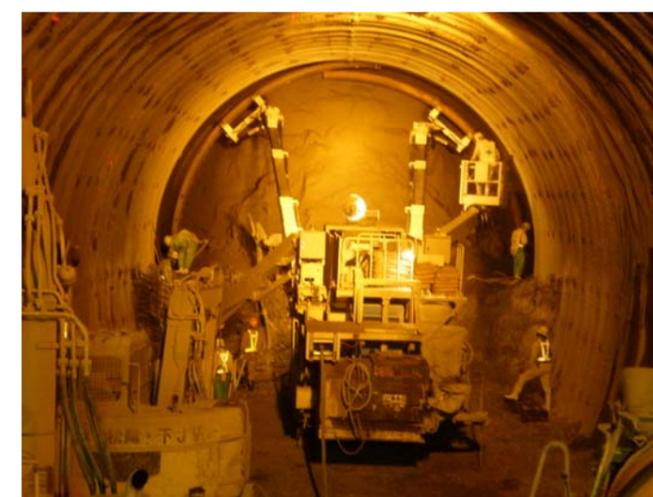

鋼製支保工建込み状況
