


俵坂トンネル(西)進捗状況 2012年6月14日現在

■ 施工完了区間

工種	単位	設計数量	累計進捗数量	進捗(%)
斜路				
トンネル掘削	m	320	320	100
本坑				
トンネル掘削	m	3,030	1,400.0	46.2
インパットコンクリート	m	3,030	850.0	28.1
覆工コンクリート	m	3,030	357.0	11.8



10Jによる切削状況

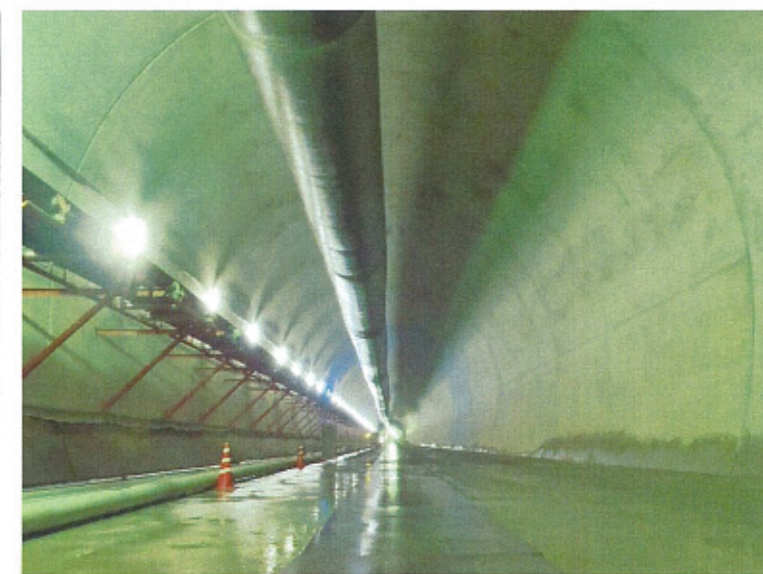

覆工コンクリート完了区間
